



PHL ENGENHARIA
phlengenharia01@gmail.com

Obra: Edifício Sede CREF9/PR
Data de Início da Obra: 16/01/17
Data de Conclusão: 10/07/18

RELATORIO QUINZENAL DE OBRA

REL 003 - Curitiba, 03 de Março de 2017
Período - 13 de fevereiro a 28 de Fevereiro

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO

1.1 Serviços realizados no período:

Montagem de canteiro de obras e áreas de vivência (escritório, almoxarifado, vestiários, sanitários, refeitório). Por causa do problema da contenção a obra apresenta baixa movimentação.

1.2 Controle de materiais e equipamentos:

Materiais do canteiro de obra

1.3 Controle de mão de obra:

Equipe RAC – Engenheiro, estagiário, almoxarife, mestre de obras e 2 ajudantes

1.4 Condições meteorológicas:



Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter
CF	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B

B: bom

CL: chuva leve

CF: chuva forte

2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO

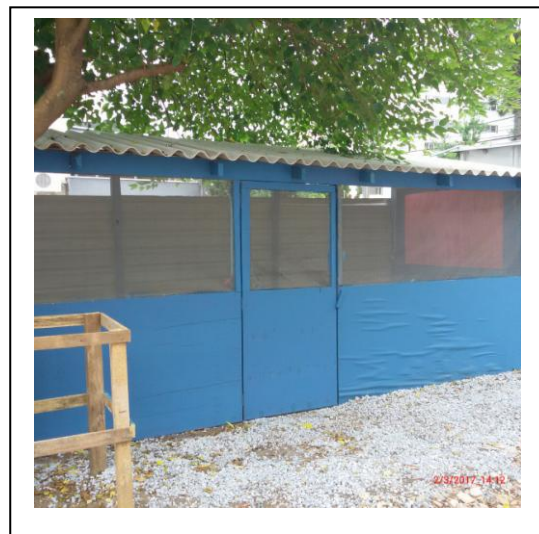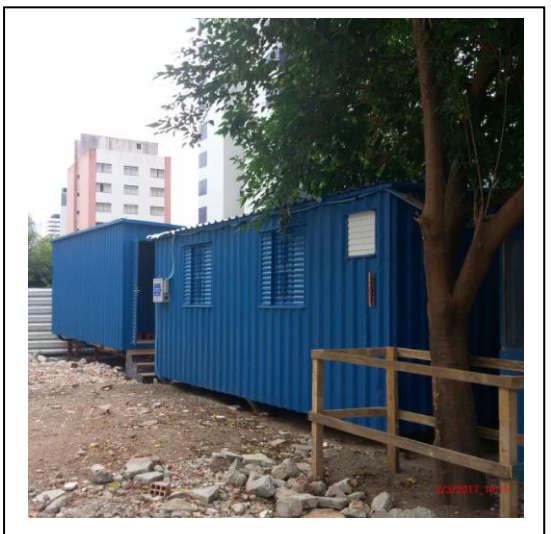

3.0 – CONTROLE LEED

Apresentado relatório de visita a obra com as seguintes pendências:

Pendência	Data	Status	Prazo	Responsável
1. Projeto do Canteiro (1ª etapa)	15/fev	Solicitado	Abril	RAC
2. Listagem de produtos que exigem o controle de VOC para aprovação.	15/fev	Solicitado	Antes da utilização dos produtos	RAC
3. Cronograma da obra	15/fev	Solicitado	Março	RAC
4. Curva ABC de Insumos	15/fev	Solicitado	Março	RAC
4. Inventário de madeiras	15/fev	Solicitado	Março	RAC
3. LOs dos possíveis destinatários para análise e aprovação.	15/fev	Solicitado	Fevereiro	RAC

4.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Atas das reuniões do período

Discussão sobre o problema da contenção. CREF autorizou a alteração de projeto pela construtora.

Reforçada a preocupação com a solução de fundação em sapata, possibilidade de problemas futuros. RAC ira apresentar projeto e orçamento de nova solução até 10/03.

Construtora propôs revisão do projeto estrutural em virtude de alterações de contenção e fundação. Arquiteta salienta que os pés direito e dimensões devem ser mantidos.

CREF tentara viabilizar junto aos órgãos públicos a retirada do ponto de taxi. Retorno até 25/02.

CREF iniciara o processo de licitação de contratação do ar condicionado. Prazo previsto 45 dias.

Solicitado à construtora orientações da parte civil.

Entregue pela arquiteta Mariana orientações sobre o arquivo morto a ser instalado.

Entregue pela arquiteta Mariana o projeto de incêndio aprovado pelos bombeiros

Questões pendentes

Solução de contenção e fundação.

Contratação das instalações de ar condicionado

Relocação do ponto de taxi

Diário de obras

O diário esta sendo preenchido em campo e se encontra atualizado.

Atenciosamente,

Pedro Henrique Locatelli
