



PHL ENGENHARIA  
[phlengenharia01@gmail.com](mailto:phlengenharia01@gmail.com)

Obra: Edifício Sede CREF9/PR  
 Data de Início da Obra: 16/01/17  
 Data de Conclusão: 10/07/18

## RELATORIO QUINZENAL DE OBRA

**REL 014 - Curitiba, 16 de Agosto de 2017**  
 Período - 01 de Agosto a 15 de Agosto.

### 1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO

#### 1.1 Serviços realizados no período:

Concretagem de vigas e pilares do 2 pavimento (100% executado).  
 Formas de laje do 2 pavimento (100% executado).  
 Armadura de laje do 2 pavimento (100% executado).  
 Concretagem de laje do 2 pavimento (100% executado).  
 Formas de pilares do 3 pavimento (80% executado).  
 Armadura de pilares do 3 pavimento (80% executado).  
 Montagem de bandeirão de proteção.

#### 1.2 Controle de materiais e equipamentos:

Aço  
 Concreto  
 Madeira

#### 1.3 Controle de mão de obra:

Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e ajudantes  
 Empreiteiro de forma e armação

#### 1.4 Condições meteorológicas:

		DIA OPERANTE		CHUVA PORÉM OPERANTE		INOPERANTE DEVIDO A CHUVAS		INOPERANTE PÓS CHUVA																								
MESES	Dia	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AGOSTO	MANHÃ																															
	TARDE																															

## 2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO



### 3.0 – CONTROLE LEED


Apresentado relatório de visita a obra com as seguintes observações:

- Croqui do canteiro de obras entregue dia 22/06/17, em análise pela Ecobuilding.
- Não foi identificada central de corpo de provas.
- Preenchimento da Planilha de Gestão de resíduos já iniciada.
- AGUARDANDO ENVIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA VERSÃO DO PROJETO VÁLIDO QUE ESTÁ SENDO EXECUTADO.

### 4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

	Mês 06	%
Previsto Mensal	R\$ 294.277,41	5,17%
Previsto Acumulado Mensal	R\$ 1.153.788,46	20,26%
Realizado Mensal	R\$ 382.760,04	6,72%
Realizado Acumulado Mensal	R\$ 1.163.037,86	20,43%

### 5.0 – CURVA S

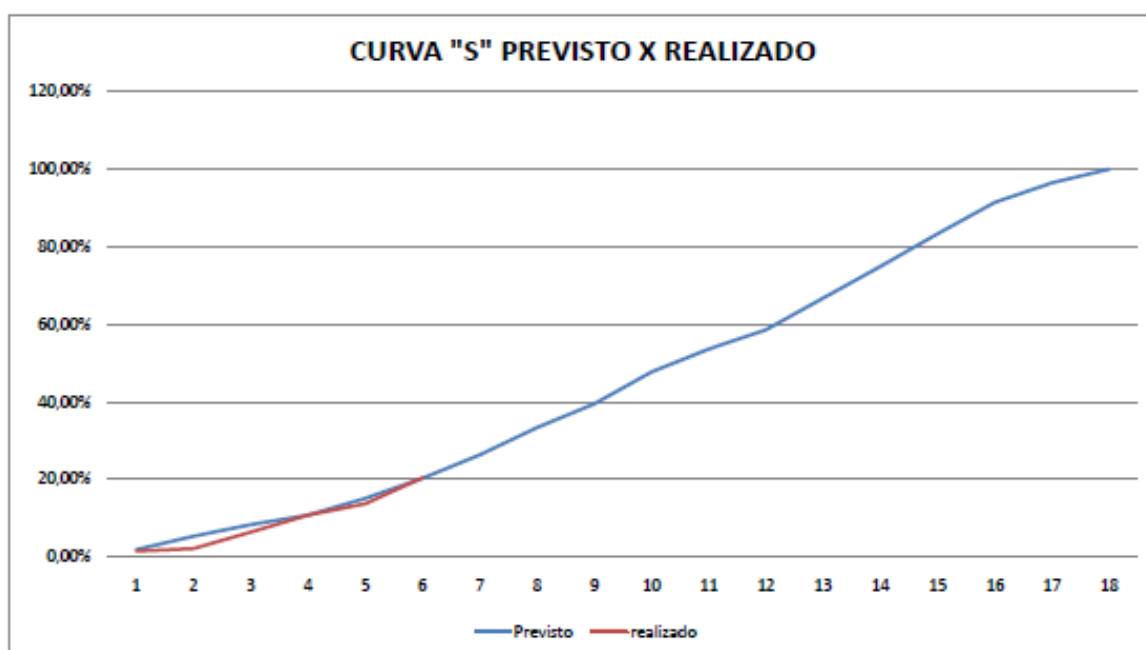

## **6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO**

- Aguardamos a confirmação do edital de licitação do ar condicionado. Previsão de contratação em 45 dias.
- Aguardamos a solução das pendências de pontuação do LEED pela Arq Mariana em conjunto com a Ecobuilding. Previsão de entrega em 15 dias

Este relatório foi elaborado e criado pela PHL ENGENHARIA e editado em uma via eletrônica, destinada ao CREF9/PR. Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que venham surgir.

Atenciosamente,

Pedro Henrique Locatelli
