



PHL ENGENHARIA
phlengenharia01@gmail.com

Obra: Edifício Sede CREF9/PR
 Data de Início da Obra: 16/01/17
 Data de Conclusão: 10/07/18

RELATORIO QUINZENAL DE OBRA

REL 037 - Curitiba, 16 de Agosto de 2018
 Período - 01 de Agosto a 15 de Agosto.

1.0 - CONTROLE DE PRODUÇÃO

1.1 Serviços realizados no período:

- Instalação de soleiras de granito.
- Execução de forro de gesso acartonado.
- Montagem de forro colmeia.
- Execução de pintura do subsolo.
- Execução de pintura do fundo preto do forro metálico.
- Execução piso externo entrada principal.
- Instalação de louças e metais.
- Parede em PVC no subsolo
- Entrega elevador 2.
- Instalações de ar condicionado



1.2 Controle de mão de obra:

Equipe RAC – Engenheiro, almoxarife, mestre de obras e ajudantes
 Empreiteiro de pintura
 Empreiteiro de hidráulica
 Instaladora de ar condicionado
 Instalador elevador

1.3 Condições meteorológicas:

		DIA OPERANTE		CHUVA PORÉM OPERANTE		INOPERANTE DEVIDO A CHUVAS		INOPERANTE PÓS CHUVA																								
MESES	Dia	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AGOSTO	MANHÃ				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X					X	X						
	TARDE				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X					X	X						

2.0 – RELATORIO FOTOGRAFICO

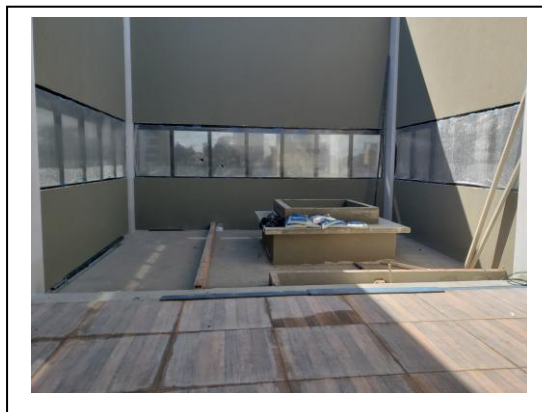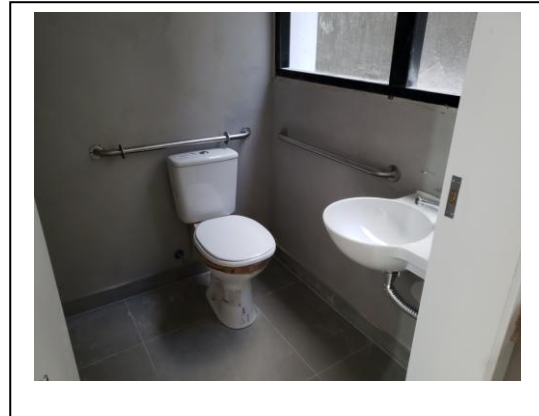


3.0 – CONTROLE LEED

Pendência documental	Status	Prazo	Responsável
1. Enviar o relatório do ensaio de INHOFF	Entregue. Aguardando informações adicionais para validação.	Agosto	RAC
2. Projeto do Canteiro (1ª etapa)	Entregue. Aguardando novos ajustes solicitados pelo Ecobuilding. A 2ª e 3ª fase estão OK. Será necessário um último projeto da fase final.	Agosto	RAC
3. Enviar o Inventário de madeiras para Ecobuilding.	Enviar inventário de madeiras considerando as alterações de projeto	Agosto	RAC
4. Enviar o PGRCC atualizado para Ecobuilding.	Enviar PGRCC com os últimos ajustes	Agosto	RAC
5. Enviar o Plano de Controle de erosão, sedimentação e poluição atualizado para Ecobuilding.	Enviar o Plano para análise com os últimos ajustes.	Agosto	RAC
6. Preencher a Planilha de gestão de resíduos com todas as saídas de resíduos até o momento e digitalizar todas as MTRs.	OK	Em andamento até o final da obra	RAC
7. Preencher a Planilha de suprimentos com todos os produtos químicos já adquiridos.	Solicitado	Agosto	RAC
8. Enviar os relatórios semanais retroativos. Podem ser quinzenais a partir de agora.	Solicitado	Agosto	RAC
9. Enviar relatório fotográfico da instalação dos restritores de vazão nas torneiras e chuveiros. Enviar ficha técnica dos restritores.	Solicitado		RAC

4.0 – CONTROLE FINANCEIRO

	Mês 18	%
Previsto Mensal	R\$ 199.898,51	3,51%
Previsto Acumulado Mensal	R\$ 5.693.598,69	100,00%
Realizado Mensal	R\$ 139.200,70	2,44%
Realizado Acumulado Mensal	R\$ 5.402.891,08	94,89%

5.0 – CURVA S

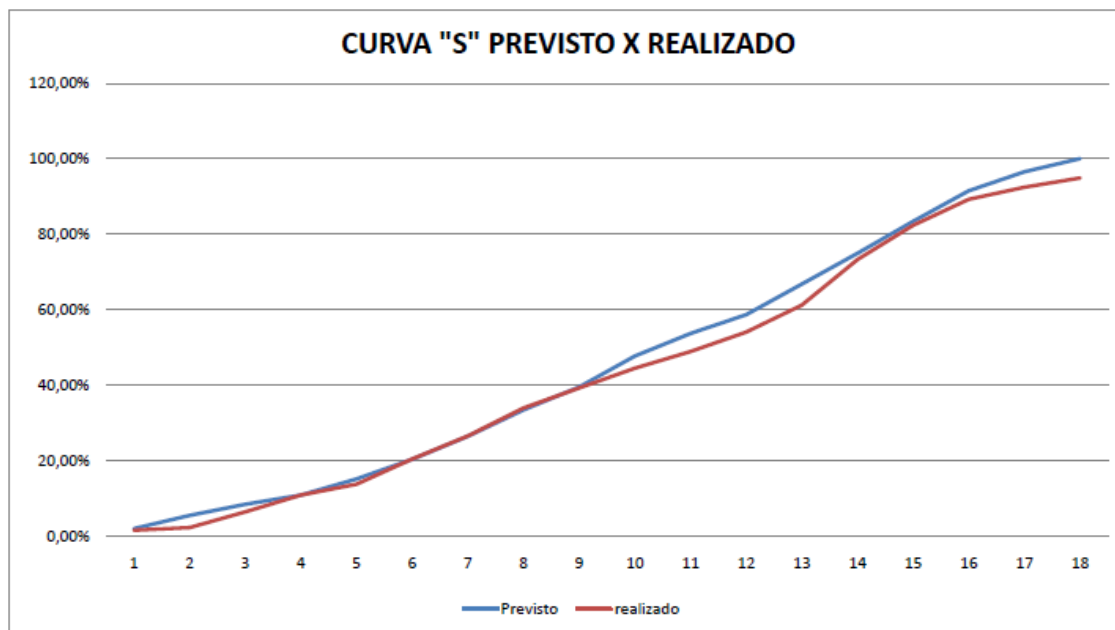

6.0 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO

- Em 05/08/18 a RAC enviou o aditivo de divisórias internas no valor total de R\$ 441.195,93
- Foi solicitado ao fornecedor das divisórias uma proposta de produto similar que atendas a todas as exigências solicitadas.
- Em 03/08/2018 foi entregue pelo projetista Eduardo Ribeiro os projetos revisados.
- Projeto luminotecnico em revisão para adequação ao novo layout.

Atenciosamente,
Pedro Henrique Locatelli
